Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

SOPPRESSIONE DEI P.L. AI KM 72+519, 73+059, 78+694 e 79+974
MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN SOTTOVIA AL KM 73+059, DI
UN CAVALCAFERROVIA AL KM 78+085 E DI UN
CAVALCAFERROVIA AL KM 79+882 NEL COMUNE DI OULX

CRONOPROGRAMMA COME DA ATTO MODIFICATIVO DEL 09/07/2024

QUADRIO COSTRUZIONI S.P.A.

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**TOTALE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI**	**2244 g**	**lun 07/10/24**	**lun 01/03/32**
2	**FASE 1 CAVALCAFERROVIA (Galleria artificiale) km 79+882**	**918 g**	**lun 07/10/24**	**ven 14/07/28**
3	CONSEGNA LAVORI	0 g	lun 07/10/24	lun 07/10/24
4	BB01 - BOE LATO NORD (1° INTERVENTO) Attestato n° 1 del 18/12/2024	67 g	lun 07/10/24	gio 12/12/24
5	BB02 - BOE LATO SUD (2° INTERVENTO) Attestato n° 2 del 01/04/2025	7 g	mar 18/03/25	lun 24/03/25
6	BB01 - BOE LATO NORD (3° INTERVENTO) Attestato n° 3 del 20/08/2025	7 g	mer 09/07/25	mar 15/07/25
7	RIMOZIONE INTERFERENZA FOINDAZIONI LINEA ALTA TENSIONE RFI (DATA PRESUNTA)	5 g	mer 01/04/26	dom 05/04/26
8	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	51 g	mer 01/04/26	gio 21/05/26
9	MU04 - REALIZZAZIONE MURI ANDATORI	51 g	ven 22/05/26	sab 11/07/26
10	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	230 g	dom 12/07/26	ven 26/02/27
11	MU02 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ALVEO	102 g	lun 12/10/26	gio 21/01/27
12	MU03 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ASSE FERROVIARIO	102 g	lun 12/10/26	gio 21/01/27
13	GA01 - REALIZZAZIONE GALLERIA FERROVIARIA	160 g	mar 03/11/26	dom 11/04/27
14	MU04 - REALIZZAZIONE MURI ANDATORI	150 g	mer 03/03/27	ven 30/07/27
15	BB01 - BOE LATO NORD	90 g	lun 12/04/27	sab 10/07/27
16	MU03 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ASSE FERROVIARIO	50 g	dom 11/07/27	dom 29/08/27
17	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	25 g	mer 25/08/27	sab 18/09/27
18	BB01 - BOE LATO NORD	90 g	dom 19/09/27	ven 17/12/27
19	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	30 g	sab 18/12/27	dom 16/01/28
20	MU01 - REALIZZAZIONE MURI SS335 - STRUTTURA A SBALZO	85 g	sab 18/12/27	sab 11/03/28
21	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	20 g	dom 12/03/28	ven 31/03/28
22	MU03 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ASSE FERROVIARIO	30 g	sab 01/04/28	dom 30/04/28
23	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	75 g	lun 01/05/28	ven 14/07/28
24	**FASE 2 SOTTOVIA OULX km 73+059**	**714 g**	**ven 14/07/28**	**ven 28/06/30**
25	CONSEGNA LAVORI	0 g	ven 14/07/28	ven 14/07/28
26	BB01 - BOE VIA S. LORENZO	33 g	sab 15/07/28	mer 16/08/28
27	NV01 - ADEGUAMENTO VIA S. LORENZO	120 g	gio 17/08/28	gio 14/12/28
28	BB03 - BOE VIABILITA' SECONDARIA	28 g	ven 17/11/28	gio 14/12/28
29	NV03 - ADEGUAM. VIAB. SEC. - VIALE DEGLI ALPINI E VIABILITA' D'ACCESSO	85 g	ven 15/12/28	ven 09/03/29
30	BB02 - BOE SS335-CORSO ORTIGARA	118 g	mar 12/12/28	dom 08/04/29
31	MU01 - REALIZZAZIONE MURI RAMPE SS335-CORSO ORTIGARA	260 g	lun 09/04/29	lun 24/12/29
32	SL01 - REALIZZAZIONE SOTTOVIA SS335-CORSO ORTIGARA	60 g	dom 11/11/29	mer 09/01/30
33	MU01 - REALIZZAZIONE MURI RAMPE SS335-CORSO ORTIGARA	85 g	gio 10/01/30	gio 04/04/30
34	NV02 - ADEGUAMENTO SS335-CORSO ORTIGARA	85 g	ven 05/04/30	ven 28/06/30
35	**FASE 3 CAVALCAFERROVIA BEAULARD km 78+085**	**612 g**	**ven 28/06/30**	**lun 01/03/32**
36	CONSEGNA LAVORI	0 g	ven 28/06/30	ven 28/06/30
37	BB01 - BOE LATO NORD	77 g	sab 29/06/30	ven 13/09/30
38	NV02 - REALIZZAZIONE DEVIAZIONE SS 335 E NUOVA ROTATORIA	212 g	sab 14/09/30	dom 13/04/31
39	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE	51 g	lun 14/04/31	mar 03/06/31
40	NW01 - REALIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA	167 g	mer 04/06/31	lun 17/11/31
41	BB02 - BOE LATO SUD	77 g	dom 25/05/31	sab 09/08/31
42	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE	160 g	dom 10/08/31	ven 16/01/32
43	NV03 - REALIZZAZIONE STRADA D'ACCESSO CAMPEGGIO - VIABILITA' SECONDARIA	45 g	sab 17/01/32	lun 01/03/32

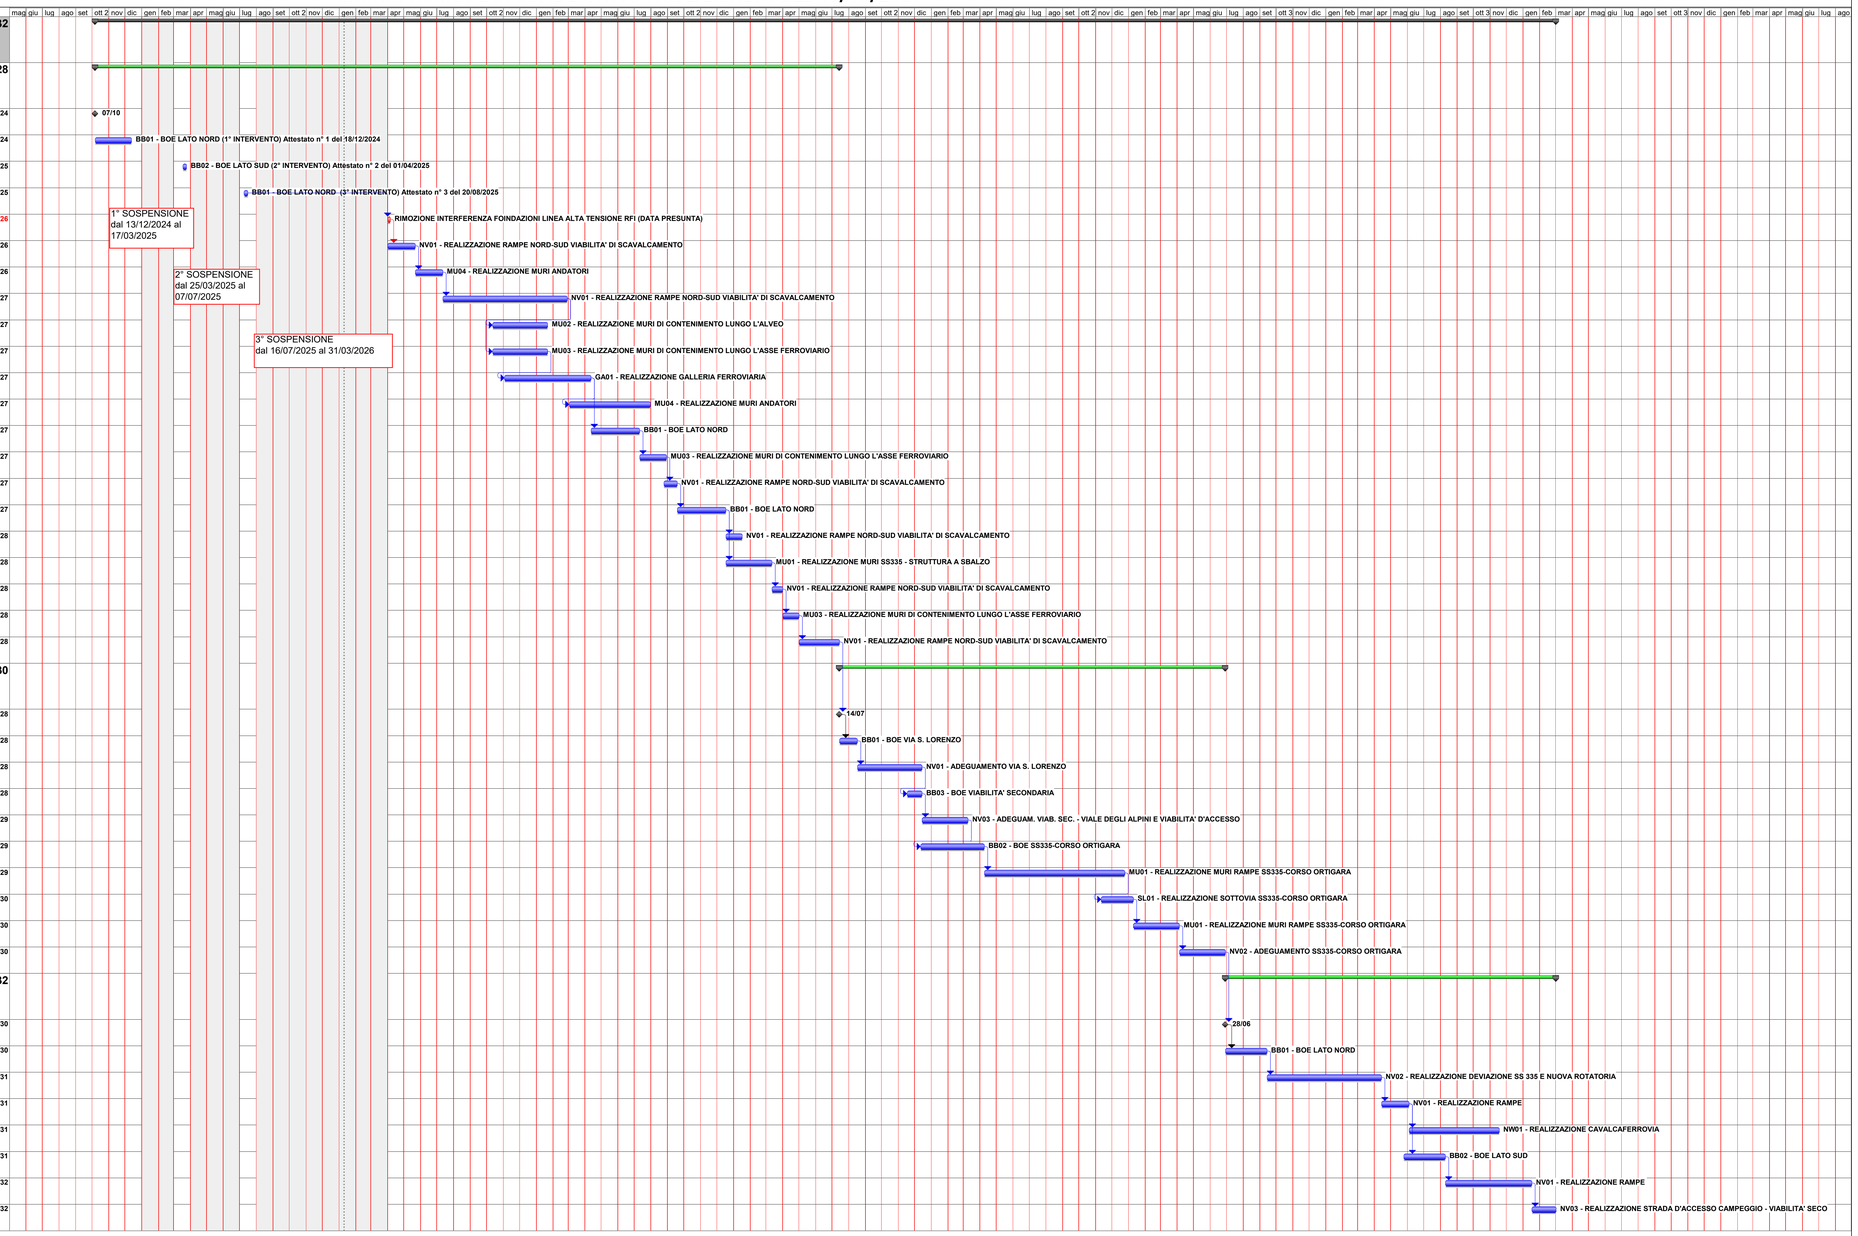

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00020951 del 10/02/2026

CARRARO SIMONE 04.02.2026 11:26:36 GMT+01:00

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza

Ven 09/01/26
