Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

SOPPRESSIONE DEI P.L. AI KM 72+519, 73+059, 78+694 e 79+974
MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN SOTTOVIA AL KM 73+059, DI
UN CAVALCAFERROVIA AL KM 78+085 E DI UN
CAVALCAFERROVIA AL KM 79+882 NEL COMUNE DI OULX

QUADRIO COSTRUZIONI S.P.A.

CRONOPROGRAMMA COME DA RICHIESTA IMPRESA IN DEROGA ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI, CON ESECUZIONE CONTEMPORANEA DEGLI INTERVENTI DI FASE 1 E FASE 2 E RIDUZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI DA COMPLESSIVI 2244 giorni A 1530

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**TOTALE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI**	**1530 g**	**lun 07/10/24**	**lun 18/03/30**
2	**FASE 1 CAVALCAFERROVIA (Galleria artificiale) km 79+882**	**918 g**	**lun 07/10/24**	**ven 14/07/28**
3	CONSEGNA LAVORI	0 g	lun 07/10/24	lun 07/10/24
4	BB01 - BOE LATO NORD (1° INTERVENTO) Attestato n° 1 del 18/12/2024	67 g	lun 07/10/24	gio 12/12/24
5	BB02 - BOE LATO SUD (2° INTERVENTO) Attestato n° 2 del 01/04/2025	7 g	mar 18/03/25	lun 24/03/25
6	BB01 - BOE LATO NORD (3° INTERVENTO) Attestato n° 3 del 20/08/2025	7 g	mer 09/07/25	mar 15/07/25
7	RIMOZIONE INTERFERENZA FOINDAZIONI LINEA ALTA TENSIONE RFI (DATA PRESUNTA)	5 g	mer 01/04/26	dom 05/04/26
8	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	51 g	mer 01/04/26	gio 21/05/26
9	MU04 - REALIZZAZIONE MURI ANDATORI	51 g	ven 22/05/26	sab 11/07/26
10	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	230 g	dom 12/07/26	ven 26/02/27
11	MU02 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ALVEO	102 g	lun 12/10/26	gio 21/01/27
12	MU03 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ASSE FERROVIARIO	102 g	lun 12/10/26	gio 21/01/27
13	GA01 - REALIZZAZIONE GALLERIA FERROVIARIA	160 g	mar 03/11/26	dom 11/04/27
14	MU04 - REALIZZAZIONE MURI ANDATORI	150 g	mer 03/03/27	ven 30/07/27
15	BB01 - BOE LATO NORD	90 g	lun 12/04/27	sab 10/07/27
16	MU03 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ASSE FERROVIARIO	50 g	dom 11/07/27	dom 29/08/27
17	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	25 g	mer 25/08/27	sab 18/09/27
18	BB01 - BOE LATO NORD	90 g	dom 19/09/27	ven 17/12/27
19	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	30 g	sab 18/12/27	dom 16/01/28
20	MU01 - REALIZZAZIONE MURI SS335 - STRUTTURA A SBALZO	85 g	sab 18/12/27	sab 11/03/28
21	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	20 g	dom 12/03/28	ven 31/03/28
22	MU03 - REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO LUNGO L'ASSE FERROVIARIO	30 g	sab 01/04/28	dom 30/04/28
23	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE NORD-SUD VIABILITA' DI SCAVALCAMENTO	75 g	lun 01/05/28	ven 14/07/28
24	**FASE 2 SOTTOVIA OULX km 73+059**	**714 g**	**mer 01/04/26**	**mar 14/03/28**
25	CONSEGNA LAVORI	0 g	mer 01/04/26	mer 01/04/26
26	BB01 - BOE VIA S. LORENZO	33 g	mer 01/04/26	dom 03/05/26
27	NV01 - ADEGUAMENTO VIA S. LORENZO	120 g	lun 04/05/26	lun 31/08/26
28	BB03 - BOE VIABILITA' SECONDARIA	28 g	mar 04/08/26	lun 31/08/26
29	NV03 - ADEGUAM. VIAB. SEC. - VIALE DEGLI ALPINI E VIABILITA' D'ACCESSO	85 g	mar 01/09/26	mar 24/11/26
30	BB02 - BOE SS335-CORSO ORTIGARA	118 g	sab 29/08/26	gio 24/12/26
31	MU01 - REALIZZAZIONE MURI RAMPE SS335-CORSO ORTIGARA	260 g	ven 25/12/26	ven 10/09/27
32	SL01 - REALIZZAZIONE SOTTOVIA SS335-CORSO ORTIGARA	60 g	gio 29/07/27	dom 26/09/27
33	MU01 - REALIZZAZIONE MURI RAMPE SS335-CORSO ORTIGARA	85 g	lun 27/09/27	lun 20/12/27
34	NV02 - ADEGUAMENTO SS335-CORSO ORTIGARA	85 g	mar 21/12/27	mar 14/03/28
35	**FASE 3 CAVALCAFERROVIA BEAULARD km 78+085**	**612 g**	**ven 14/07/28**	**lun 18/03/30**
36	CONSEGNA LAVORI	0 g	ven 14/07/28	ven 14/07/28
37	BB01 - BOE LATO NORD	77 g	sab 15/07/28	ven 29/09/28
38	NV02 - REALIZZAZIONE DEVIAZIONE SS 335 E NUOVA ROTATORIA	212 g	sab 30/09/28	dom 29/04/29
39	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE	51 g	lun 30/04/29	mar 19/06/29
40	NW01 - REALIZZAZIONE CAVALCAFERROVIA	167 g	mer 20/06/29	lun 03/12/29
41	BB02 - BOE LATO SUD	77 g	dom 10/06/29	sab 25/08/29
42	NV01 - REALIZZAZIONE RAMPE	160 g	dom 26/08/29	ven 01/02/30
43	NV03 - REALIZZAZIONE STRADA D'ACCESSO CAMPEGGIO - VIABILITA' SECONDARIA	45 g	sab 02/02/30	lun 18/03/30

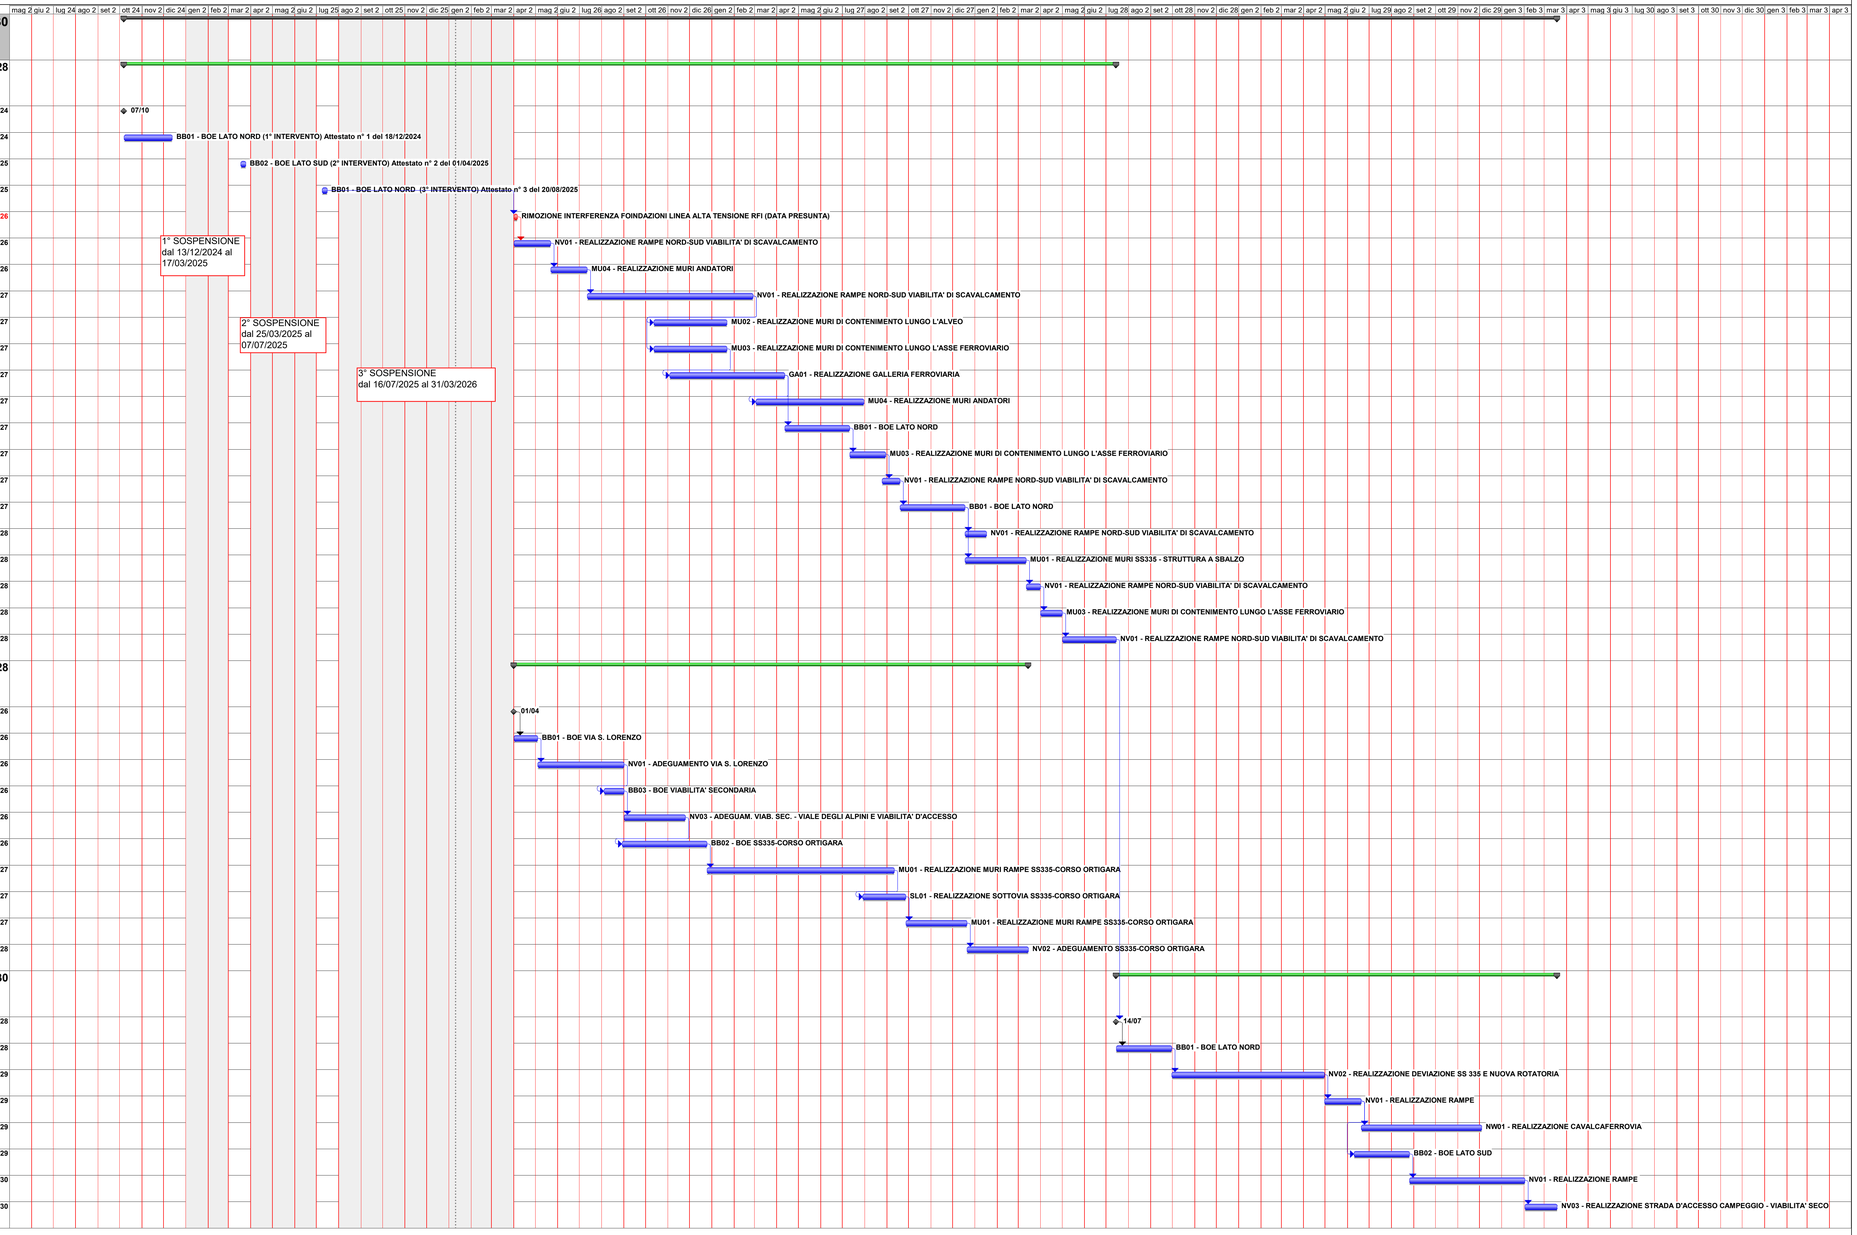

Arrivo: AOO A1600A_N. Prot. 00020951 del 10/02/2026

CARRARO SIMONE 04.02.2026 11:26:36 GMT+01:00

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Attività esterne | Cardine esterno | Scadenza

Ven 09/01/2026
